


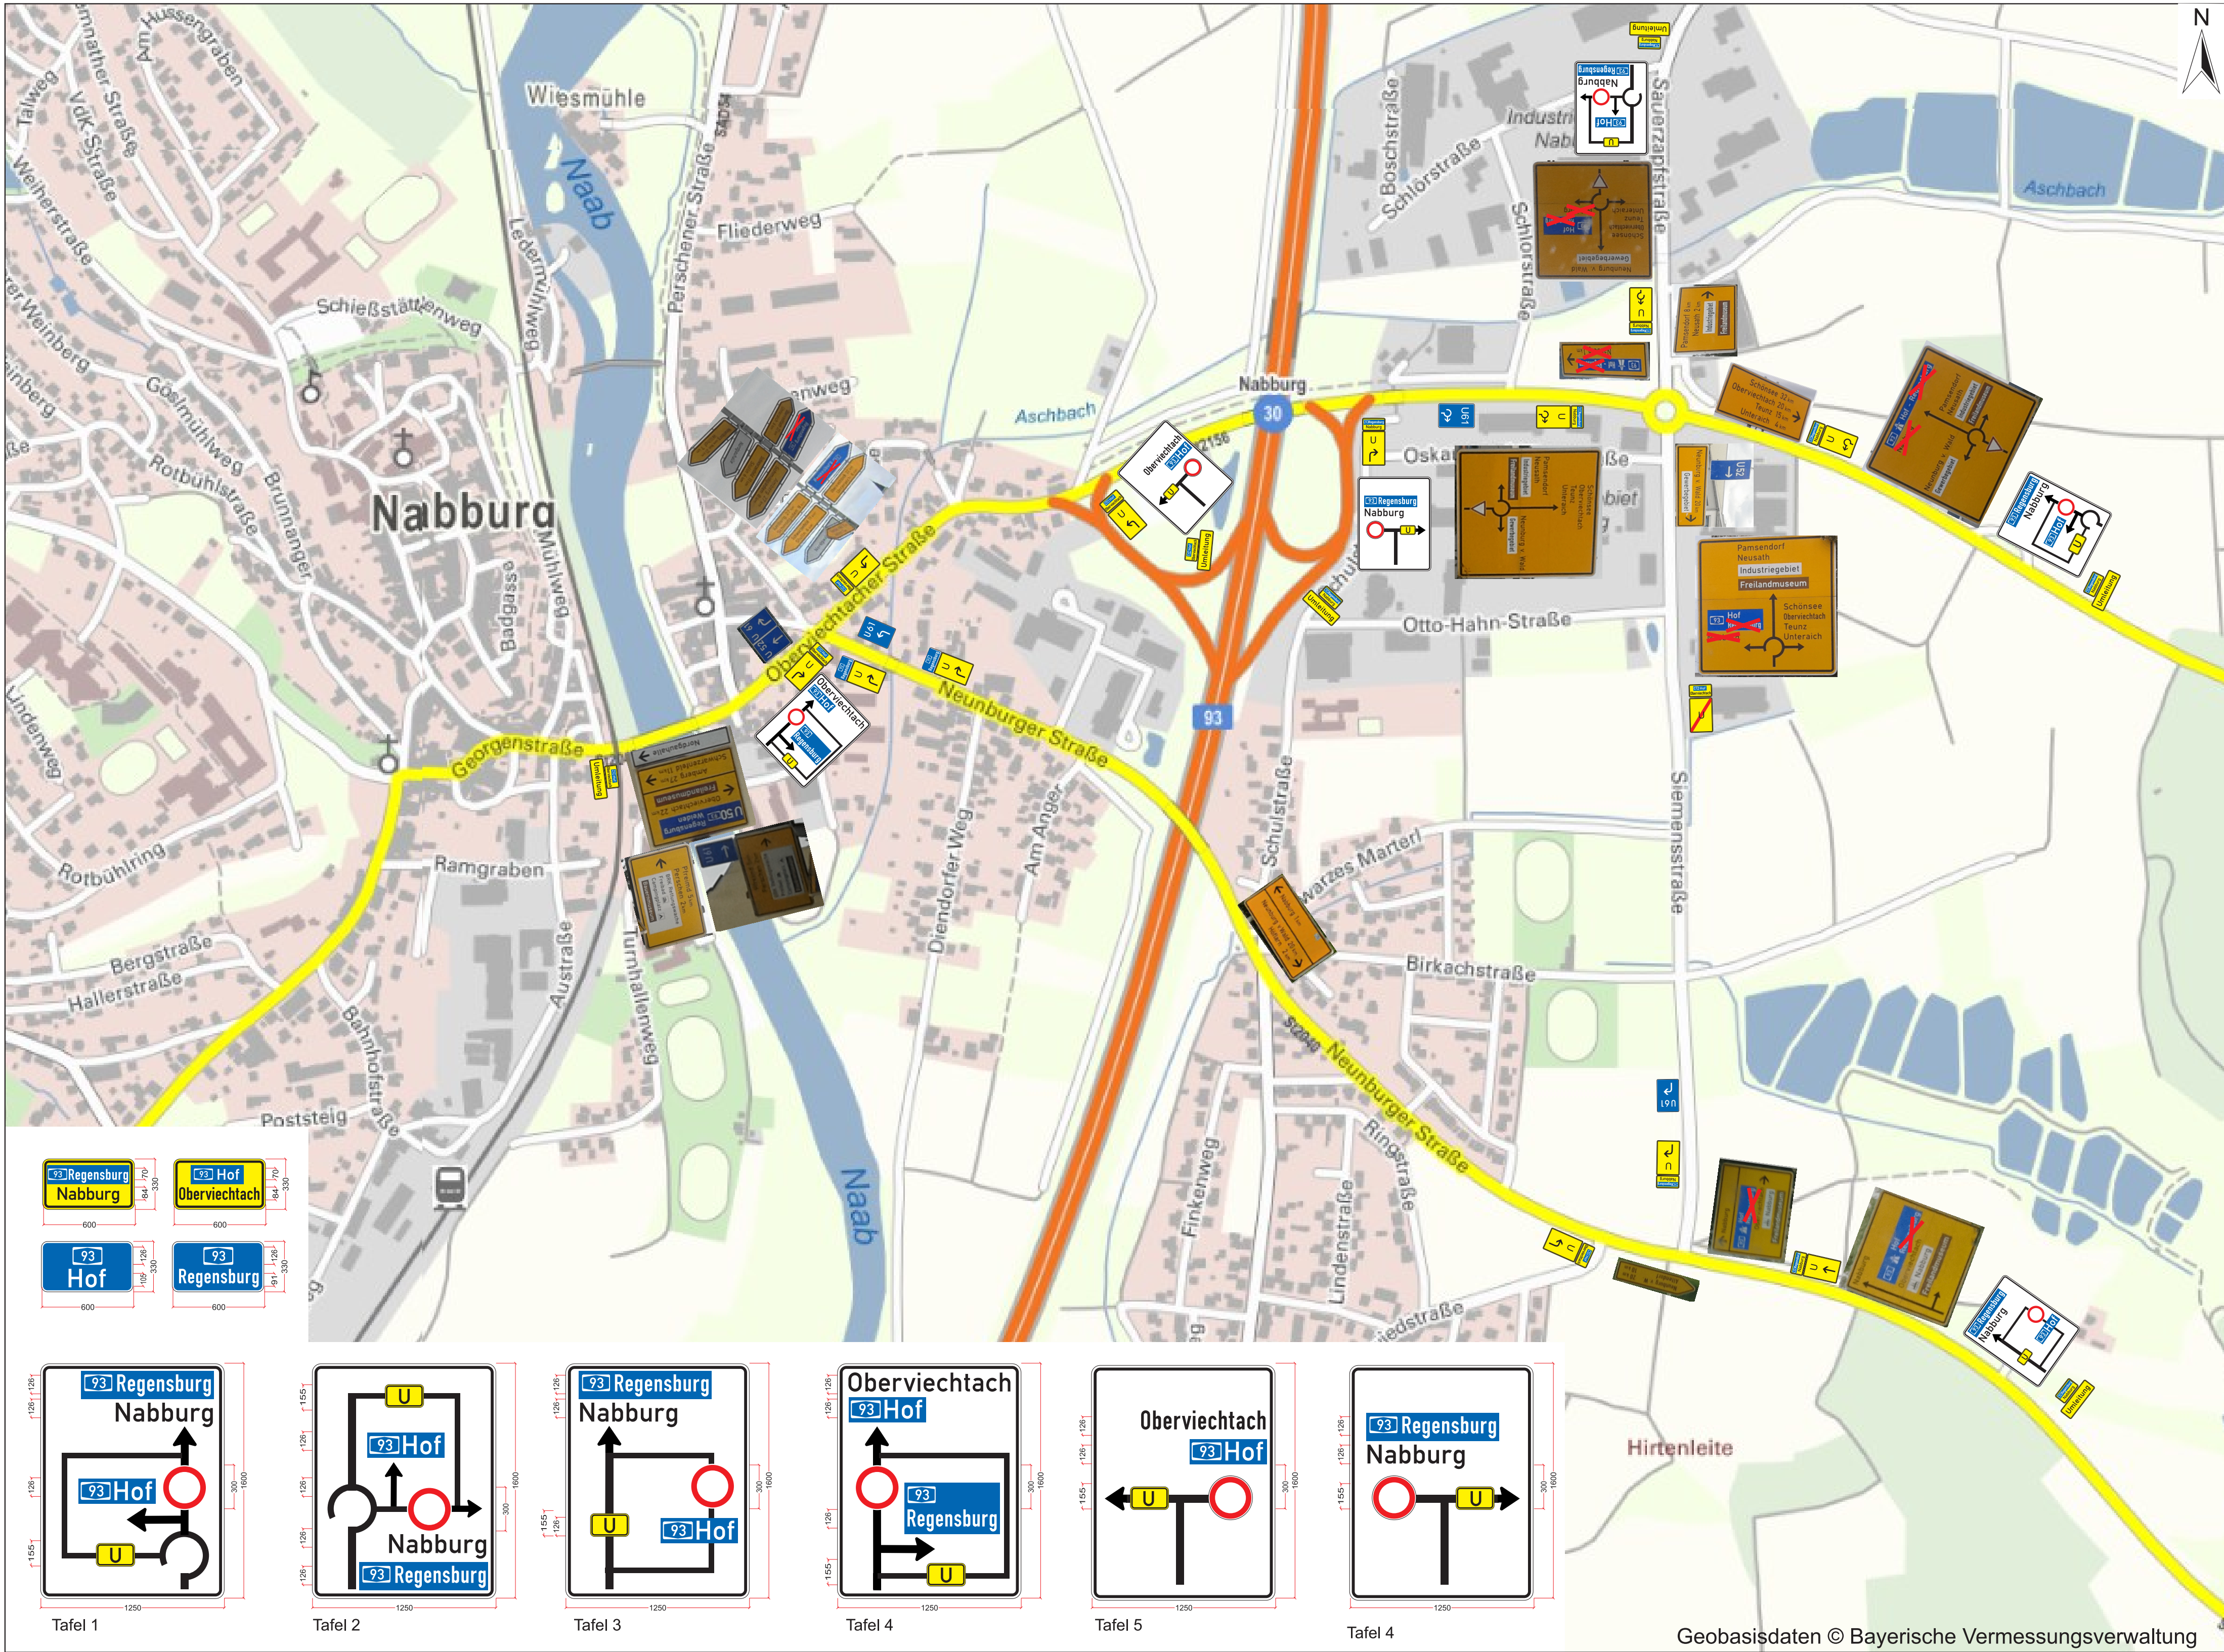

Legende

- Beschilderung - Bestand
- Beschilderung - Baustelle
- Beschilderung - Bestand, Entfall während Bauzeit
- Beschilderung - Entfall
- Markierung gelb
- Leitborde
- transportable Schutzeinrichtung T1/≤W3
- transportable Schutzeinrichtung T3/≤W2
- transportable Schutzeinrichtung T3/≤W4
- transportable Schutzeinrichtung H1/≤W5
- transportable Schutzeinrichtung H2/≤W2 bzw. / W5
- Standort Kontrollchip
- Baubereich

Allgemeine Bemerkungen

- Im Zuge der Einrichtung der Schutzwand ist eine Längsabspernung à 50 m vorzusehen. Dient diese Abspernung dem Schutz der Arbeiter, so ist der Abstand Baubereich auf à 25 m zu verkürzen. Der Aufbau der Schutzwände hat im gesperrten Bereich zu erfolgen.
- Bei offenen Schutzplanken ist der durchgehende Verkehr analog Regelplan DI/1 zu führen.
- Nach Rückbau der Verkehrsführungen ist die Fahrbahn zu reinigen.
- Bei längeren Arbeitspausen sind die Baustellenein- und ausfahrten mit Baken zu schließen und die Beschilderung abzudecken.
- Bei Verkehrszeichen und -einrichtungen ohne km-Angabe sind die Standorte örtlich durch die Bauführung festzulegen. Vorhandene Streckenverbote und Wegweisungen sind anzupassen.
- Beim Auskreuzen von Zielen oder Fahrbeziehungen sind ausschließlich mobile Auskreuzvorrichtungen oder ähnliches zu verwenden.
- Die Schutzwände sind analog dem jeweiligen Anprallversuch des Systems aufzustellen (insbesondere bezüglich Systemlänge, Verdübelung, usw.). Vorhandene Leitpfosten bleiben erhalten (Abstand 50 m).

Alle widersprüchlichen Festbeschilderungen müssen deaktiviert bzw. unkenntlich gemacht werden!
Geschwindigkeiten etc. durch Abhängen mit undurchsichtigen Kunststoffsäcken!
Diese müssen so befestigt- / angebracht sein, dass ein selbständiges Aufdecken ausgeschlossen wird!

Die Autobahn
Niederlassung Nordbayern
Außenstelle Fürth
Nürnberg Straße 18, 90762 Fürth

bearbeitet:		
gezeichnet:		
geprüft:		
Projekt-Nr.:	Erneuerung BW 144c	
Bezeichnung:		
Dat:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	---
Höhensystem	DHHN12(NN) - (EPSG 7699)	Bestandsvermessung	2023

AUSSCHREIBUNG

Die Autobahn GmbH des Bundes		Unterlage / Blatt-Nr.: 11 / 13	
Straße / Abschnitt-Nr. / Station: St2156 / 140 / 0,451 bis 160 / 0,125		Verkehrszeichenplan Umleitung St 2156	
PROJIS-Nr.:		Maßstab: ohne	
BAB A93, BW 144c Erneuerung Überführung der St 2156 AS Nabburg - Bau-km 144+760			
Aufgestellt: Niederlassung Nordbayern Außenstelle Fürth			

93 Regensburg
Nabburg

600 330

93 Hof
Oberviechtach

600 330

93 Hof

600 330

93 Regensburg

600 330

Tafel 1

Tafel 2

Tafel 3

Tafel 4

Tafel 5

Tafel 4
